Bản chia sẻ PUB-R1 · 05/11/2026. Nội dung kế hoạch/baseline là snapshot theo revision gốc; xem TEAM-HANDOFF để biết phân công mới. Link đã chuyển cho repo; SHA nguồn và SHA bản xuất ở PUBLICATION-MANIFEST.json. Phát hành Git không tự đóng gate/code/test. TEAM-HANDOFF

WAREHOUSE / W00 / CONTROLLED DELIVERY PLAN

Hồ sơ đã chốt.
Bàn giao có kiểm soát.

WH-PLAN-W00-20261105-R1

Kế hoạch riêng cho baseline tài liệu, contract và bàn giao BE/FE/Tester. Hồ sơ R2 đã hoàn thành; tiếp nhận nhân sự được theo dõi riêng.

3	15	1:1:1	R1
Task tách theo vai trò	Microtask có đầu ra	BE / FE / Tester	Phiên bản được chốt

APPROVED FOR EXECUTION PLANNING
Codex — Điều phối theo ủy quyền người dùng ngày 05/11/2026 · 05/11/2026
Baseline WH-DEC-20261105-R2; tài liệu và issue được phát hành theo yêu cầu người dùng. Không tự ký review hoặc nghiệm thu sản phẩm.

1. Kiểm soát tài liệu và thẩm quyền

Trường	Nội dung
Mã / revision	WH-PLAN-W00-20261105-R1 / R1
Trạng thái	APPROVED FOR EXECUTION PLANNING
Ngày / timezone	05/11/2026 / Asia/Ho_Chi_Minh
Người lập và phê duyệt	Codex — Điều phối theo ủy quyền người dùng ngày 05/11/2026; quyền điều phối được người dùng giao rõ ràng.
Độc lập kiểm chứng	Không có review độc lập mới trong task phát hành kế hoạch; code acceptance tương lai cần reviewer khác người viết.
Baseline source	384c53d9f9c81d320793069b3dffd690ae88c0af + dirty diff khi nhận việc; không coi HEAD một mình là toàn bộ trạng thái WIP.
Phạm vi	W00 tài liệu/bàn giao; W01 gate/harness/test. Đợt này lập kế hoạch và tạo issue; chưa sửa app source.
Phát hành	Markdown gốc · Dữ liệu plan · Task CSV · Microtask CSV


Phạm vi thiết kế được giữ nguyên

Giữ Gateway/gRPC/Storage và Ant Design/Redux ở đích W02. W01 dùng API legacy thực tế để dựng harness; không giả /api/v1 đã chạy. POS thật và SMS phase sau. Không CI/CD, deploy, commit/push, .env hoặc DB hiện hữu.

WIP upload giữ ownership file module/authority/main/lint và migration047. Người nhận W01 không revert hay sửa trùng; cần ghi nhận dirty diff trước mỗi lần test.

2. Phase và điều kiện chuyển

Phase	Entry → Exit	Trạng thái
P0 · Thiết kế và quyết định	Nguồn thiết kế gốc và ủy quyền điều phối → 37 quyết định R2 và hồ sơ BE/FE/ Tester có hash	COMPLETE_DOCUMENTATION
P1 · Bàn giao và phân công	P0 hồ sơ đã chốt → Issue đầy đủ, owner tiếp nhận phạm vi và bằng chứng cần nộp	ISSUES_PUBLISHED_RECEIPT_PENDING
P2 · Ổn định gate BE/FE	Đọc R2, ghi SHA/diff và runtime → Full gate tái lập được; sửa có nguyên nhân; không hạ tiêu chí	NOT_STARTED
P3 · Implement harness API/DB/browser	Sửa gate và test basis/target đã cấp → Migration/seed/reset/race helpers và browser smoke chạy với API thật	NOT_STARTED
P4 · Kiểm chứng và nghiệm thu	Hợp nhất đúng diff, harness và smoke có thể chạy → QA đạt, review code độc lập, E02b verified, owner acceptance có thật	NOT_STARTED



3. Bảng tiến độ và trách nhiệm

12/15 microtask checklist đã có bằng chứng. Chỉ số này là checklist hồ sơ/công việc, không phải phần trăm code hoặc effort. W01 code/test chưa bắt đầu trong lần phát hành này.

Task / role	Effort / dependencies	Trạng thái / issue
W00-BE Bàn giao contract API, dữ liệu, quyền và migration BE01	0–0 ngày công Không có task code trước	DOCUMENTATION_COMPLETE_RECEIPT_PENDING #158
W00-FE Bàn giao screen contract, trạng thái UI và phạm vi frontend FE01	0–0 ngày công Không có task code trước	DOCUMENTATION_COMPLETE_RECEIPT_PENDING #159
W00-QA Bàn giao test basis, fixture và grant môi trường test QA01	0–0 ngày công Không có task code trước	DOCUMENTATION_COMPLETE_RECEIPT_PENDING #160

Quy tắc cập nhật tiến độ


Người nhận ghi tên thật, actual_start, effort còn lại và evidence. READY_FOR_QA có diff/log; COMPLETE có bằng chứng đúng scope. BLOCKED phải có owner, tác động và điều kiện mở. Issue open/closed khác task COMPLETE và package ACCEPTED. Không tự gán assignee khi chưa có tên người thực hiện.

Trách nhiệm và bàn giao

Vị trí BE01/FE01/QA01 tương ứng đội 1:1:1. Người nhận việc ghi tên và thời điểm thực tế; không tạo thêm nhân sự hoặc chữ ký giả.

Vai trò	Trách nhiệm	Bàn giao
Điều phối	Chốt phạm vi/plan/issue, ưu tiên, ownership, CR và gate.	Approval record + issue map; không ký thay QA/reviewer.
BE01	Sửa spec và implement API/DB harness trong ownership.	Code/diff, unit/API/DB logs, migration/ seed/reset/runbook.
FE01	Ổn định full check và implement browser smoke.	Code/diff, full check, browser evidence desktop/mobile.
QA01	Test basis, chạy thật, defects/retest/test completion.	Expected/actual/evidence; không tự sửa production code để né FAIL.
Review / owner acceptance	Reviewer độc lập với người viết; BE/FE peer-review có thể dùng. Owner phê duyệt nghiệm thu có thật.	Review đúng diff + acceptance record; chưa có giữ pending.

4. Sơ đồ và lịch nguồn lực

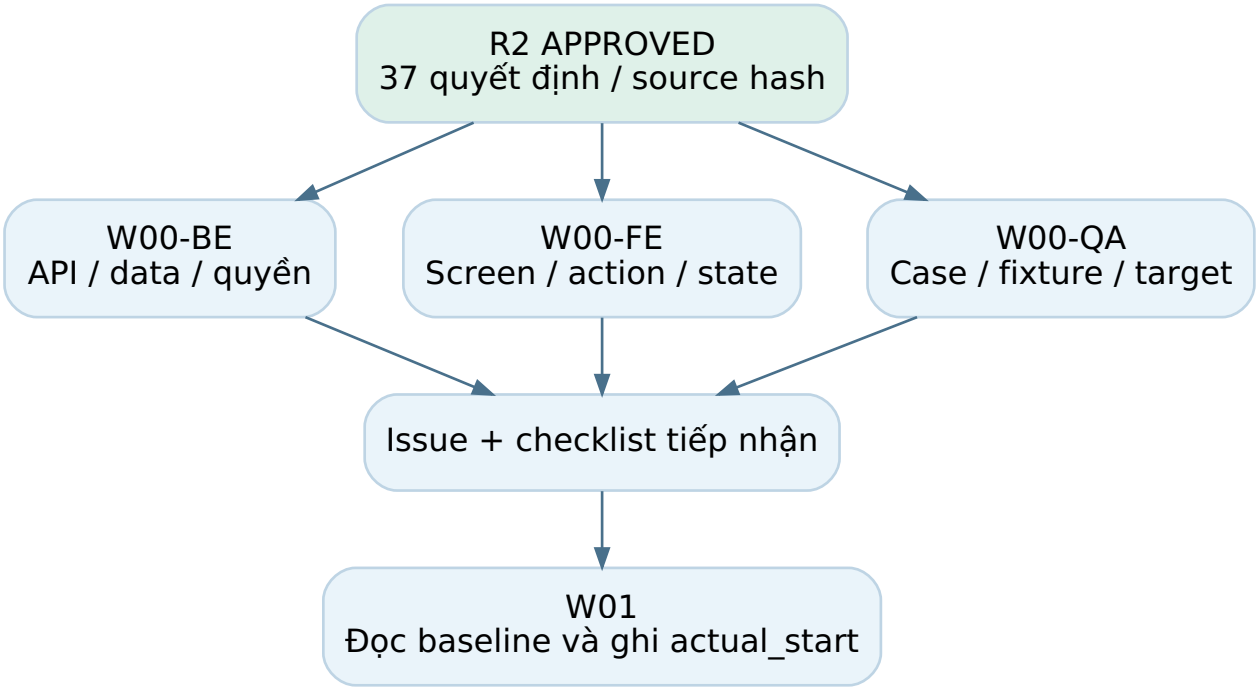

Phần hồ sơ không tính lại effort đã hoàn thành. Việc đọc/nhận scope nằm trong đầu task W01. Receipt pending không mở lại các quyết định nghiệp vụ hoặc xóa trạng thái hồ sơ COMPLETE.

5. Task và microtask được giao

Mỗi microtask có đầu ra và điều kiện đạt. Dấu COMPLETE ở W00 kế thừa bằng chứng hồ sơ R2 hoặc publication đã readback, không phải code mới thực hiện.

W00-BE / BE / P1

Bàn giao contract API, dữ liệu, quyền và migration

Ownership: Hồ sơ local W00; chỉ đọc app/warehouse-api; không sửa source upload của worker khác.

Issue: #158 · **Tracker:** W00-BE

Microtask	Thực hiện / đầu ra	Điều kiện đạt / trạng thái
W00-BE-M01	Ghi nhận contract API/gRPC/quyền đã hoàn thành ở R2 **Đầu ra:** SRC-01 và contracts/	Ref và hash còn đúng; không gọi design validation là API PASS COMPLETE
W00-BE-M02	Ghi nhận data dictionary, transaction và migration policy **Đầu ra:** 339 field occurrences; data-and-migration.md	Không sửa migration đã chạy; migration047 thuộc worker upload COMPLETE
W00-BE-M03	Chốt phạm vi giao W01 và phân biệt legacy với v1 **Đầu ra:** Issue W01-BE-01/02	Sửa spec/harness; giữ compatibility; v1/gRPC thuộc W02 COMPLETE
W00-BE-M04	Đưa hồ sơ bàn giao vào issue có liên kết chéo **Đầu ra:** Issue body và issue-map	Link parent/child hợp lệ, có acceptance và hash baseline COMPLETE
W00-BE-M05	BE thực nhận và ghi SHA/diff/owner **Đầu ra:** Biên bản nhận việc	Tên người thực hiện thật, actual_start khi bắt đầu W01; chưa có thì giữ pending NOT_STARTED

Nghiệm thu task

- Giữ nguyên WH-DEC-20261105-R2; 161operations/84schemas là target, chưa phải API đang chạy.
- BE nhận đúng source baseline và giới hạn W01; không làm foundation W02 trước gate.

Bàn giao screen contract, trạng thái UI và phạm vi frontend

Ownership: Hồ sơ local W00; chỉ đọc app/warehouse-ui; không chuyển toàn UI sang AntD trong W01.

Issue: #159 · **Tracker:** W00-FE

Microtask	Thực hiện / đầu ra	Điều kiện đạt / trạng thái
W00-FE-M01	Ghi nhận screen/action/state và schema target **Đầu ra:** screen-contracts.json	32 màn có action/role/state; wireframe không là browser evidence COMPLETE
W00-FE-M02	Ghi nhận responsive/token và quy tắc lỗi **Đầu ra:** design-tokens.json và screen-contracts.md	401/403/409/offline đúng contract; FE không thay backend RBAC COMPLETE
W00-FE-M03	Chốt các task FE W01 và cách lưu test evidence **Đầu ra:** W01-FE-01/02	Không mock HTTP trong smoke tích hợp thật, không bật capability chưa có API COMPLETE
W00-FE-M04	Phát hành checklist/issue và liên kết API harness **Đầu ra:** Issue map	Phụ thuộc BE-02 rõ; ghi browser API target và fixture version COMPLETE
W00-FE-M05	FE thực nhận ownership và ghi người làm **Đầu ra:** Biên bản nhận việc	Tên người thật; không tự gán assignee GitHub khi chưa biết NOT_STARTED

Nghiệm thu task

- 32screen/7archetype là thiết kế; ảnh fixture không phải live API.
- Giữ AntD/Redux ở đích W02, FSD/vi-en/dark-light; W01 chỉ sửa gate và smoke.

Bàn giao test basis, fixture và grant môi trường test

Ownership: Hồ sơ test/bằng chứng local; chưa chạy migration hoặc ghi DB trong task lập kế hoạch này.

Issue: #160 · **Tracker:** W00-QA

Microtask	Thực hiện / đầu ra	Điều kiện đạt / trạng thái
W00-QA-M01	Ghi nhận test basis và truy vết R2 **Đầu ra:** Test basis464case và230trace rows	Không coi số liên kết là mọi nhánh đã PASS COMPLETE
W00-QA-M02	Ghi nhận fixture8actor/3kho và target grant **Đầu ra:** SRC-06/07	Password/token không ghi trong issue; lấy token bằng login thật sau bootstrap COMPLETE
W00-QA-M03	Chốt ma trận riêng cho W01 và giới hạn smoke **Đầu ra:** test-matrix.csv	Có expected/evidence/owner; basic RBAC không thay full auth/RBAC W02 COMPLETE
W00-QA-M04	Phát hành issue QA và protocol E02b **Đầu ra:** Issue QA-01/02	Test design khác test result; E02b chỉ verified sau run thật COMPLETE
W00-QA-M05	Tester thực nhận và chốt run identifier **Đầu ra:** Biên bản nhận việc	Tên người thật, target handle và SHA/diff trước khi chạy NOT_STARTED

Nghiệm thu task

- 464case ở R2 vẫn DESIGNED_NOT_RUN; W01 có case harness riêng.
- Grant target mới không cho phép truy cập DB hiện hữu hoặc công bố RBAC đạt từ JSONfixture.

6. Hồ sơ kiểm chứng và nghiệm thu

W01-TC01..12 có setup, expected, actual/evidence và mức kiểm chứng trong test-matrix.csv. Tất cả case W01 còn NOT_RUN. Basic bootstrap/RBAC W01 không thay full auth/session/RBAC W02; helper race không chứng minh transaction tồn kho W04.

Case	Mục tiêu / mức kiểm	Kỳ vọng
W01-TC01	Target/config sai CONFIG_GUARD	Dừng trước connect/write; không dùng fallback.env
W01-TC02	Migration/seed thật REAL_DB	Có history/fixture version; không synchronize, không leak secret
W01-TC03	Seed/reset chạy lại REAL_DB	Số user/kho/quyền ổn định, không trùng và không tác động DB khác
W01-TC04	Login/profile REAL_API_DB_REDIS	200 đúng actor; không giả token hoặc bypass guards
W01-TC05	Ẩn danh REAL_API	401; không trả dữ liệu
W01-TC06	Thiếu authority REAL_API_DB	403, không dùng SUPER_ADMIN bypass; không trả dữ liệu
W01-TC07	Scope kho REAL_API_DB	Danh sách chỉ khoA; khoB bị che/chặn theo endpoint policy; không lộ dataB
W01-TC08	Rollback và helper race REAL_DB_HELPER	Barrier hoạt động, rollback không để ghi dở; không công bố nghiệp vụ confirm W04 đã PASS
W01-TC09	Browser login/list desktop REAL_BROWSER_API	API thật trả đúng dữ liệu/scope; không route.fulfill; không lỗi console chặn
W01-TC10	Browser mobile REAL_BROWSER_API	Thao tác chính dùng được; không overflow che action; evidence cùng run
W01-TC11	Browser auth/deny/logout REAL_BROWSER_API	Không hiển thị data trái phép; logout xóa session client; API vẫn quyết định quyền
W01-TC12	Full gate và test discovery FULL_GATE	Không suite compile/test fail chưa xử lý, không skip/coverage downgrade/no-tests-found

Run manifest bắt buộc

Run ID, timestamp, người chạy, Node24, exact command/exit, SHA và diff hash, target/fixture version, expected/actual, log/file hash, defects, retest và reviewer. Không password/token/private config. Lưu FAIL và NOT_RUN đúng thực tế; không bỏ test hoặc hạ coverage.

> **Gate mở W02 implement:** W01-QA.T COMPLETE, E02b VERIFIED bằng API/DB/Redis thật; full gate/browser có evidence, review code độc lập và owner acceptance đúng diff. Hồ sơ được duyệt không tự mở gate sản phẩm.

7. Rủi ro, thay đổi và cách vận hành

Rủi ro / owner	Xử lý / điều kiện mở
Snapshot04/11 cũ · BE/FE/QA	Tái lập trên SHA+dirtydiff thực; không gọi log cũ là kết quả live.
App start có cron/outbox/external transport · BE	Composition test vô hiệu side effects ngoài target test, cấu hình fail-closed; không vô hiệu guards để giả integration.
Migration legacy không chạy sạch · BE + điều phối	Ghi failure/DDL/history trên target mới; không sửa migration đã chạy hoặc dùng synchronize. Defect ngoài phạm vi có owner/plan.
Tranh chấp test resources · FE/QA	Tái lập worker/isolation/cleanup; giữ timeout/coverage; ghi cấu hình và chạy full check.
WIP upload / ID migration trùng · điều phối	Giữ ownership/migration047; đọc lại maxmigration khi nhận việc; không revert edits người khác.
Scope/effort vượt range · điều phối	CR/revision nếu đổi thiết kế; reforecast từ actuals, không âm thầm đổi baseline/hash.

Checkpoint thủ công đầu/cuối ngày làm việc, không tạo lịch chạy nền. Người thực hiện cập nhật progress-state/task tracker và GitHub checklist cùng evidence; không có cơ chế đồng bộ tự động được tuyên bố trong tài liệu này.

Template run/defect/completion · Quy trình track · Protocol và lệnh thực thi

8. Nguồn, truy vết và ISO tailoring

Nguồn	Artifact / SHA256
SRC-01 · Baseline quyết định R2	Mở artifact local a2f836650b3ced1b4b29a3bb8c03b55d29ca6b7ec74e2e616a59b8c758f9e070
SRC-02 · Kế hoạch R2 đội1:1:1	Mở artifact local 4e2297e24a97da80ef0df80739e9f1eef2d63113332940467d512717a95bddb5
SRC-03 · Gate và bằng chứng	Mở artifact local a3cdc81a6e40177766dcec4941bf38d85fb8849f7e6e94f1231ae3d15f9e719c
SRC-04 · Dossier W00	Mở artifact local 87d10bea82cf212635efa152b11f609f4234b970287f7b7e1e6603b0789fe275
SRC-05 · Dossier W01	Mở artifact local 63669bfa727f31b8f2226656553f9a712b4db46ad9318ad7533ec6b3dd529234
SRC-06 · Fixture 8actor/3kho	Mở artifact local d78e5a2c5c021431b1128478a77470c24884d54117d95368ffb911d2a4825470
SRC-07 · Grant test local	Mở artifact local 20fd89e74b7c8e7b76240a2b8346cee60b8ff8dc70667613d5de7e6a69f9e1e6
SRC-08 · Carryover upload	Mở artifact local bcd5421891a9124d9e03abd77372204ac9efec3b3a1c84d2d0db0315140e8314
SRC-09 · Audit API compile cũ	Mở artifact local 0e330d011e92d3cc6354a8cd941ed5114a9c088e5dd6478634356914b01e8767
SRC-10 · Audit UI full check cũ	Mở artifact local dddce18843cea07d8f45e16ec8c83c0932e312ec0d2ea09d5c82a7ca58860ade

Source hash bảo vệ tính toàn vẹn phiên bản; không thay đánh giá nội dung hoặc product test. Tài liệu local chưa nằm trên GitHub; issue chứa checklist/acceptance có thể đọc trực tiếp.

ISO tailoring và lịch sử phát hành

Tiêu chuẩn tham chiếu	Tailoring áp dụng trong hồ sơ
ISO/IEC/IEEE 15289:2019	Tổ chức mục đích, nội dung và kiểm soát hồ sơ vòng đời; mã tài liệu, phiên bản, nguồn, trách nhiệm và đầu ra.
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Nguồn yêu cầu, truy vết sang task/case, acceptance criteria và kiểm soát thay đổi yêu cầu.
ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021	Test plan, test design, case/procedure, execution record, incident và test completion report.
ISO 21502:2020	Lập WBS, trách nhiệm, phụ thuộc, nguồn lực, mốc, rủi ro và báo cáo tiến độ.

Cấu trúc tài liệu đã có mã/phiên bản, thẩm quyền phê duyệt, nguồn, WBS/ownership, entry/exit, evidence, traceability, rủi ro và change log. Đây là tailoring của dự án theo phạm vi công khai của tiêu chuẩn; chưa phải chứng nhận hoặc đánh giá tuân thủ đầy đủ từng điều khoản. Không tự tạo số clause.

9. Lịch sử thay đổi và phát hành

Revision / ngày	Nội dung / người phê duyệt
R1 /05/11/2026	Plan riêng W00/W01,9task49microtask,11issue; giữ R2 design, bổ sung phụ thuộc browser thật và bảng tiến độ. Codex — Điều phối theo ủy quyền người dùng ngày 05/11/2026

Issue publication map · Source register · Markdown plan
