Bản chia sẻ PUB-R1 · 05/11/2026. Nội dung kế hoạch/baseline là snapshot theo revision gốc; xem TEAM-HANDOFF để biết phân công mới. Link đã chuyển cho repo; SHA nguồn và SHA bản xuất ở PUBLICATION-MANIFEST.json. Phát hành Git không tự đóng gate/code/test. TEAM-HANDOFF

WAREHOUSE / W01 / CONTROLLED DELIVERY PLAN

Khôi phục gate. Dựng harness kiểm thử.

WH-PLAN-W01-20261105-R1

Kế hoạch riêng từ tái lập lỗi, sửa gate đến migration/seed, API/DB/ browser thật và nghiệm thu. Không lấy phê duyệt tài liệu thay kết quả ứng dụng.

6	34	1:1:1	R1
Task tách theo vai trò	Microtask có đầu ra	BE / FE / Tester	Phiên bản được chốt

APPROVED FOR EXECUTION PLANNING
Codex — Điều phối theo ủy quyền người dùng ngày 05/11/2026 · 05/11/2026
Baseline WH-DEC-20261105-R2; tài liệu và issue được phát hành theo yêu cầu người dùng. Không tự ký review hoặc nghiệm thu sản phẩm.

1. Kiểm soát tài liệu và thẩm quyền

Trường	Nội dung
Mã / revision	WH-PLAN-W01-20261105-R1 / R1
Trạng thái	APPROVED FOR EXECUTION PLANNING
Ngày / timezone	05/11/2026 / Asia/Ho_Chi_Minh
Người lập và phê duyệt	Codex — Điều phối theo ủy quyền người dùng ngày 05/11/2026; quyền điều phối được người dùng giao rõ ràng.
Độc lập kiểm chứng	Không có review độc lập mới trong task phát hành kế hoạch; code acceptance tương lai cần reviewer khác người viết.
Baseline source	384c53d9f9c81d320793069b3dffd690ae88c0af + dirty diff khi nhận việc; không coi HEAD một mình là toàn bộ trạng thái WIP.
Phạm vi	W00 tài liệu/bàn giao; W01 gate/harness/test. Đợt này lập kế hoạch và tạo issue; chưa sửa app source.
Phát hành	Markdown gốc · Dữ liệu plan · Task CSV · Microtask CSV


Phạm vi thiết kế được giữ nguyên

Giữ Gateway/gRPC/Storage và Ant Design/Redux ở đích W02. W01 dùng API legacy thực tế để dựng harness; không giả /api/v1 đã chạy. POS thật và SMS phase sau. Không CI/CD, deploy, commit/push, .env hoặc DB hiện hữu.

WIP upload giữ ownership file module/authority/main/lint và migration047. Người nhận W01 không revert hay sửa trùng; cần ghi nhận dirty diff trước mỗi lần test.

2. Phase và điều kiện chuyển

Phase	Entry → Exit	Trạng thái
P0 · Thiết kế và quyết định	Nguồn thiết kế gốc và ủy quyền điều phối → 37 quyết định R2 và hồ sơ BE/FE/ Tester có hash	COMPLETE_DOCUMENTATION
P1 · Bàn giao và phân công	P0 hồ sơ đã chốt → Issue đầy đủ, owner tiếp nhận phạm vi và bằng chứng cần nộp	ISSUES_PUBLISHED_RECEIPT_PENDING
P2 · Ổn định gate BE/FE	Đọc R2, ghi SHA/diff và runtime → Full gate tái lập được; sửa có nguyên nhân; không hạ tiêu chí	NOT_STARTED
P3 · Implement harness API/DB/browser	Sửa gate và test basis/target đã cấp → Migration/seed/reset/race helpers và browser smoke chạy với API thật	NOT_STARTED
P4 · Kiểm chứng và nghiệm thu	Hợp nhất đúng diff, harness và smoke có thể chạy → QA đạt, review code độc lập, E02b verified, owner acceptance có thật	NOT_STARTED



3. Bảng tiến độ và trách nhiệm

0/34 microtask checklist đã có bằng chứng. Chỉ số này là checklist hồ sơ/công việc, không phải phần trăm code hoặc effort. W01 code/test chưa bắt đầu trong lần phát hành này.

Task / role	Effort / dependencies	Trạng thái / issue
W01-BE-01 Sửa compile/spec lệch DTO và khôi phục gate backend BE01	1–2 ngày công Không có task code trước	NOT_STARTED #161
W01-BE-02 Implement harness API + DB, migration/ seed/reset và helper race BE01	3–5 ngày công W01-BE-01	NOT_STARTED #162
W01-FE-01 Tái lập và ổn định full check frontend FE01	3–5 ngày công Không có task code trước	NOT_STARTED #163
W01-FE-02 Implement browser smoke đăng nhập và danh sách với API thật FE01	1–2 ngày công W01-FE-01, W01-BE-02	NOT_STARTED #164
W01-QA-01 Hoàn thiện test plan, fixture/run protocol và ma trận W01 QA01	2–3 ngày công Không có task code trước	NOT_STARTED #165
W01-QA-02 Chạy full gate/API/browser thật, retest và đóng E02b/W01 QA01	3–5 ngày công W01-QA-01, W01-BE-02, W01-FE-02	NOT_STARTED #166

Quy tắc cập nhật tiến độ

Người nhận ghi tên thật, actual_start, effort còn lại và evidence. READY_FOR_QA có diff/log; COMPLETE có bằng chứng đúng scope. BLOCKED phải có owner, tác động và điều kiện mở. Issue open/closed khác task COMPLETE và package ACCEPTED. Không tự gán assignee khi chưa có tên người thực hiện.


Trách nhiệm và bàn giao

Vị trí BE01/FE01/QA01 tương ứng đội 1:1:1. Người nhận việc ghi tên và thời điểm thực tế; không tạo thêm nhân sự hoặc chữ ký giả.


Vai trò	Trách nhiệm	Bàn giao
Điều phối	Chốt phạm vi/plan/issue, ưu tiên, ownership, CR và gate.	Approval record + issue map; không ký thay QA/reviewer.
BE01	Sửa spec và implement API/DB harness trong ownership.	Code/diff, unit/API/DB logs, migration/ seed/reset/runbook.
FE01	Ổn định full check và implement browser smoke.	Code/diff, full check, browser evidence desktop/mobile.
QA01	Test basis, chạy thật, defects/retest/test completion.	Expected/actual/evidence; không tự sửa production code để né FAIL.
Review / owner acceptance	Reviewer độc lập với người viết; BE/FE peer-review có thể dùng. Owner phê duyệt nghiệm thu có thật.	Review đúng diff + acceptance record; chưa có giữ pending.

4. Sơ đồ và lịch nguồn lực

Effort BE4–7, FE4–7, Tester5–8 ngày công. **Cửa sổ chi tiết: 8–14 ngày làm việc từ T0**, vì browser thật chờ API harness. T0/actual_start và deadline chưa chốt. Không trùng tài nguyên trong từng vai trò. Cửa sổ tổng quát R2 là7–12ngày; điều phối chốt R1 thành8–14 do phụ thuộc browser thật, giữ nguyên effort. Forecast toàn dự án rolling reforecast sau W01.

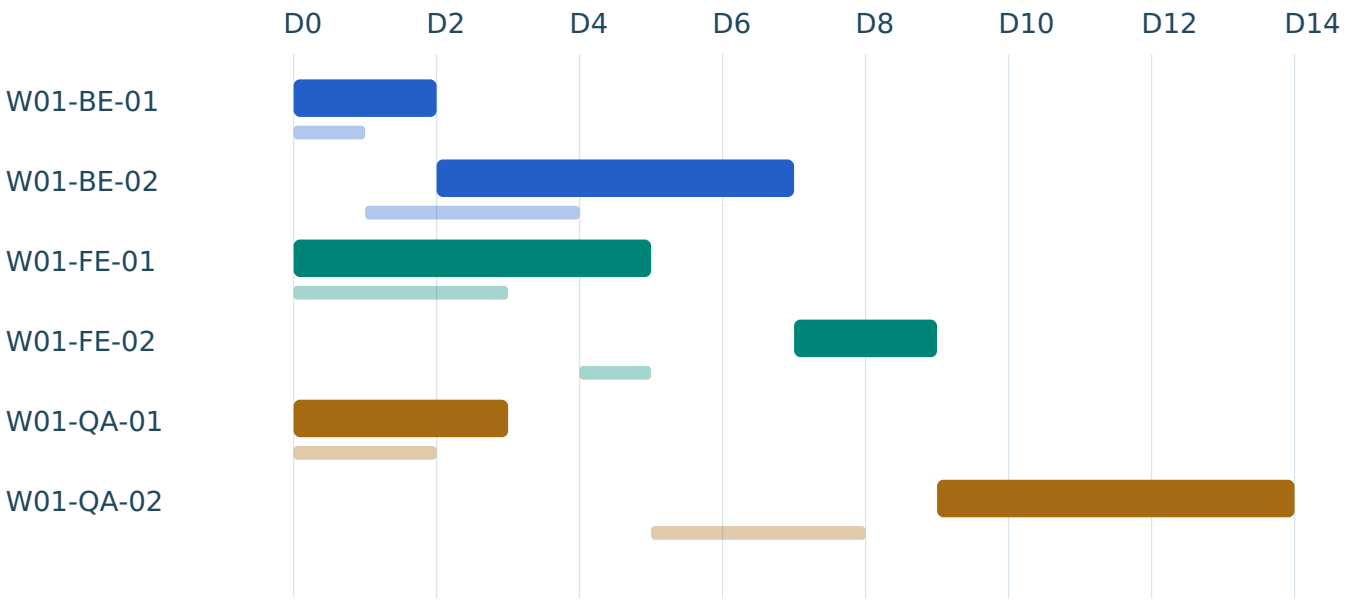

Thanh đậm: kịch bản cao; thanh nhạt: kịch bản thấp. Đây là lịch dự kiến, chưa có actual.

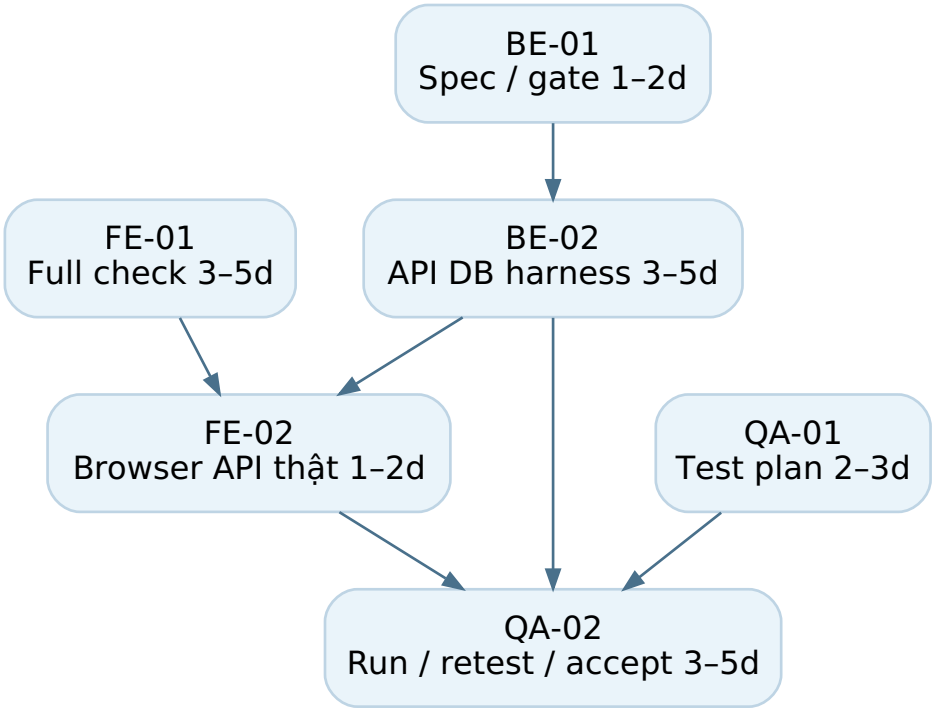

5. Task và microtask được giao

Mỗi microtask có đầu ra và điều kiện đạt. Dấu COMPLETE ở W00 kế thừa bằng chứng hồ sơ R2 hoặc publication đã readback, không phải code mới thực hiện.

W01-BE-01 / BE / P2

Sửa compile/spec lệch DTO và khôi phục gate backend

Ownership: app/warehouse-api/src/warehouse/warehouse.service.spec.ts; file test thực sự lỗi sau tái lập. Không sửa .eslintrc.js/main.ts/file module WIP.

Issue: #161 · **Tracker:** W01-BE.I

Microtask	Thực hiện / đầu ra	Điều kiện đạt / trạng thái
W01-BE-01-M01	Đọc DTO/mapper và ghi baseline lỗi thật **Đầu ra:** Repro trên Node24, SHA+dirtydiff	So log04/11 với trạng thái hiện tại; không gọi lỗi cũ là live FAIL NOT_STARTED
W01-BE-01-M02	Đối chiếu5 lỗi TS2339 tại spec296-298/830/840 **Đầu ra:** Bảng assertion → DTO thực	Chốt manager/store nested contract hiện có, không ép kiểu any để né lỗi NOT_STARTED
W01-BE-01-M03	Sửa assertion và fixture test tối thiểu **Đầu ra:** Diff warehouse.service.spec.ts	Kiểm cùng hành vi DTO hiện hành, không xóa assertion nghiệp vụ NOT_STARTED
W01-BE-01-M04	Chạy target spec rồi full unit/typecheck/ lint/build không fix **Đầu ra:** Evidence commands/exits	Không skip suite; build dùng nest build riêng để tránh npm build gọi lint--fix NOT_STARTED
W01-BE-01-M05	Đối soát WIP và bàn giao QA/peer review **Đầu ra:** Handoff exact diff và log hash	Không sửa file worker upload; lỗi ngoài scope thành defect có owner NOT_STARTED

Nghiệm thu task

- Không thêm lại managerSlug/storeSlug/storeName vào production DTO chỉ để làm xanh spec.
- Full unit suite và cả production/test typecheck không lỗi; giữ contract nghiệp vụ.

Implement harness API + DB, migration/ seed/reset và helper race

Ownership: app/warehouse-api/test/** và test config mới; cấu hình test riêng nếu cần trong src/ config dưới ownership rõ. Không .env, không sửa migration047 hay migration đã chạy.

Issue: #162 · **Tracker:** W01-BE.I

Microtask	Thực hiện / đầu ra	Điều kiện đạt / trạng thái
W01-BE-02-M01	Thiết kế harness entry point và kiểm config không đọc.env **Đầu ra:** Test-only config/DataSource và fail-closed guard	Sai DB/container/name thì dừng trước connect/write; cấm prod config fallback NOT_STARTED
W01-BE-02-M02	Cấu hình Jest e2e và src alias đúng root **Đầu ra:** jest-e2e config	test:e2e tìm thấy test, không chấp nhận no tests found NOT_STARTED
W01-BE-02-M03	Chạy migration/seed trên target test mới được cấp **Đầu ra:** Migration history + fixture manifest	Không dùng npm typeorm:r với config mặc định đọc dotenv; không synchronize NOT_STARTED
W01-BE-02-M04	Implement reset/cleanup, seed idempotent và privacy logs **Đầu ra:** Helpers + rerun evidence	Reset giới hạn target, không truncate DB khác; không log secret NOT_STARTED
W01-BE-02-M05	Implement login/me/warehouse-list/deny và DB transaction/race smoke **Đầu ra:** Case W01-TC01..08	Guards thật; Supervisor chỉ thấy kho của mình, thiếu quyền bị403; fixture khôngSUPER_ADMIN NOT_STARTED
W01-BE-02-M06	Kiểm client helper hai connection/barrier và rollback **Đầu ra:** Race/rollback evidence	Ghi rõ infrastructure helper khác business confirm race W04; không báo tồn kho race PASS NOT_STARTED
W01-BE-02-M07	Bàn giao endpoint/baseURL, reset và reviewed diff **Đầu ra:** Handoff cho FE/QA	Private credential ngoài issue; worker upload được giữ nguyên NOT_STARTED

Nghiệm thu task

- Target allowlist + container ownership check; cấm synchronize và không import dotenv hiện hữu.
- Test thật dùng AppModule/guard/DB/Redis đúng composition; không override guard/repository để giả tích hợp.
- Migration vào DB mới có history log; chạy seed/reset hai lần không tạo trùng; token qua login thật.

W01-FE-01 / FE / P2

Tái lập và ổn định full check frontend

Ownership: Các file test/import-export thực sự lỗi; vite.config.ts chỉ khi chứng minh nguyên nhân pool/isolation. Không sửa capability/API/role nghiệp vụ để né test.

Issue: #163 · **Tracker:** W01-FE

Microtask	Thực hiện / đầu ra	Điều kiện đạt / trạng thái
W01-FE-01-M01	Chạy full check tái lập với Node24 và lưu resource/worker settings **Đầu ra:** Run manifest	43 lỗi04/11 là snapshot; ghi kết quả mới đúng actual NOT_STARTED
W01-FE-01-M02	Phân nhóm timeout và lỗi tìm control, đọc source/test **Đầu ra:** Failure catalogue	Phân biệt tranh chấp tài nguyên, cleanup, async/UI regression bằng repro NOT_STARTED
W01-FE-01-M03	Sửa fixture/cleanup/async hoặc UI bug có căn cứ **Đầu ra:** Diff nhỏ theo nhóm lỗi	Không đổi API/permission/rules đã chốt; vi phạm R2 ngoài W01 phải có defect/CR NOT_STARTED
W01-FE-01-M04	Nếu chỉnh worker/isolation, đo và ghi lý do **Đầu ra:** Config comparison	Không tăng timeout/ẩn lỗi; budget tài nguyên lặp lại được NOT_STARTED
W01-FE-01-M05	Chạy full check và peer review diff cuối **Đầu ra:** Lint/typecheck/coverage/build/format evidence	Mọi bước PASS cùng SHA/diff, không dùng exit0 của wrapper che lệnh con lỗi NOT_STARTED

Nghiệm thu task

- Chạy full check; rerun7file245tests không thay full gate.
- Không tăng timeout, hạ coverage, skip/flaky retry để che FAIL; giữ FSD, vi/en, dark/light.

Implement browser smoke đăng nhập và danh sách với API thật

Ownership: app/warehouse-ui/e2e/**, playwright.config.ts và package/lock nếu thêm test runner. Tránh chạm production API/cache ngoài lỗi được giao.

Issue: #164 · **Tracker:** W01-FE

Microtask	Thực hiện / đầu ra	Điều kiện đạt / trạng thái
W01-FE-02-M01	Chốt smoke case, baseURL/ports và fixture interface với BE **Đầu ra:** Smoke config contract	Nêu API legacy chính xác; không hardcode password/token trong test/ repo NOT_STARTED
W01-FE-02-M02	Thêm browser test runner/config và script nếu chưa có **Đầu ra:** Package/lock + isolated e2e dir	Không đổi Node hoặc upgrade app để né incompatibility; không CI config NOT_STARTED
W01-FE-02-M03	Implement login + danh sách kho bằng API thật **Đầu ra:** W01-TC09/10	Không stub network; chụp API target/ fixtureversion/actor alias không lộ token NOT_STARTED
W01-FE-02-M04	Implement auth-negative, warehouse scope và logout smoke **Đầu ra:** W01-TC11	User thường/thiếu quyền; scope chéo không lộ data; không dùng SUPER_ADMIN bypass NOT_STARTED
W01-FE-02-M05	Chạy desktop1440/mobile390, lưu trace/ screenshot và handoff **Đầu ra:** Browser evidence + exact diff	Fixture UI unit/mock chỉ ghi riêng; failed test không bị retry thành acceptancePASS NOT_STARTED

Nghiệm thu task

- Không route.fulfill/mock HTTP trong smoke REAL_API; login bằng fixture thật.
- Nối legacy endpoints đang chạy; target /api/v1 chưa có không được giả là đã implement.
- Màn danh sách không rỗng do stub; cùng warehouse scope từ API.

Hoàn thiện test plan, fixture/run protocol và ma trận W01

Ownership: Hồ sơ/test matrix/evidence của W01; seed design với BE, không sửa code sản phẩm thay developer.

Issue: #165 · **Tracker:** W01-QA.D

Microtask	Thực hiện / đầu ra	Điều kiện đạt / trạng thái
W01-QA-01-M01	Đối chiếu test basis R2 với scope W01 **Đầu ra:** Scope/case decision log	Không test foundation W02 như đã có; không sửa expected theo code sai NOT_STARTED
W01-QA-01-M02	Đóng case IDs, input/expected và dataset **Đầu ra:** test-matrix W01-TC01..12	Có anon/deny/scope/isolation/cleanup/ negative; không chỉ happy path NOT_STARTED
W01-QA-01-M03	Thiết kế seed/reset/test clock và ownership **Đầu ra:** Fixture manifest/version	Không ghi credential vào hồ sơ công khai; không sửa.env NOT_STARTED
W01-QA-01-M04	Lập run manifest, defect và evidence templates **Đầu ra:** Templates dùng ngay	SHA+dirtydiff, Node24, command/exit, DBtarget, case, actual và hash NOT_STARTED
W01-QA-01-M05	Bàn giao test plan cho BE/FE và lịch run nguồn lực **Đầu ra:** Test plan được điều phối chốt	QA design có thể song song; QA thực thi chờ BE/FE outputs NOT_STARTED

Nghiệm thu task

- Mỗi case có setup/input/expected/actual/status/evidence level, requirement và task links.
- Tám actor/ba kho từ R2; ít nhất Admin, Manager, Supervisor và user thiếu authority cho smoke.
- Phân biệt E02b bootstrap/basic RBAC với security/refresh/idle/RBAC đầy đủ ở W02.

Chạy full gate/API/browser thật, retest và đóng E02b/W01

Ownership: Evidence/test summary/defect và cập nhật tracker; không tự sửa source khi QA thấy lỗi.

Issue: #166 · **Tracker:** W01-QA.T

Microtask	Thực hiện / đầu ra	Điều kiện đạt / trạng thái
W01-QA-02-M01	Xác minh target handle/grant, config/ credential protection và exact diff **Đầu ra:** Run preflight record	Không đọc.env/DB hiện hữu; probe cũ không chứng minh hiện đang sẵn sàng NOT_STARTED
W01-QA-02-M02	Chạy unit/typecheck/full UI check cùng baseline cuối **Đầu ra:** Gate logs	Không còn failure compile/test chưa xử lý; không no-tests-found NOT_STARTED
W01-QA-02-M03	Chạy API/DB migration-seed-reset-login-deny-scope/rollback/race helper **Đầu ra:** W01-TC01..08/12 actuals	Ghi rõ basic RBAC test nào, không suy rộng refresh/idle/W02 PASS NOT_STARTED
W01-QA-02-M04	Chạy browser1440/390 với API thật và fixture thường **Đầu ra:** W01-TC09..11 actuals	Trace/screenshot/console sạch lỗi chặn; không network stubs NOT_STARTED
W01-QA-02-M05	Triage defect, trả BE/FE sửa trong ownership rồi retest **Đầu ra:** Defect/retest log	Không QA tự đổi expected; defect vượt range effort phải coordinator reforecast NOT_STARTED
W01-QA-02-M06	Thu code review độc lập, owner acceptance và test completion report **Đầu ra:** Review đúng diff + approval thật	Không tự ký reviewerPASS; BE/FE peer-review có thể dùng trong đội1:1:1 NOT_STARTED
W01-QA-02-M07	Cập nhật E02b và task/package tracker sau evidence **Đầu ra:** Gate registry + W01 acceptance	Issue closed không tự đổi package accepted; kiểm evidence trước mỗi cập nhật NOT_STARTED

Nghiệm thu task

- Chạy đúng reviewed SHA/diff, mọi case bắt buộc PASS không có defect chặn chưa giải quyết.
- Đủ API/DB/Redis/browser thật và run isolation; unit/schema/probe không thay bằng chứng này.
- Code review độc lập với người viết và owner acceptance có thật; chưa đủ giữ NOT_RUN/ BLOCKED.
- Chỉ mở W02 implement khi W01-QA.T COMPLETE và E02b VERIFIED; báo cáo phase local, không production ready.

6. Hồ sơ kiểm chứng và nghiệm thu

W01-TC01..12 có setup, expected, actual/evidence và mức kiểm chứng trong test-matrix.csv. Tất cả case W01 còn NOT_RUN. Basic bootstrap/RBAC W01 không thay full auth/session/RBAC W02; helper race không chứng minh transaction tồn kho W04.

Case	Mục tiêu / mức kiểm	Kỳ vọng
W01-TC01	Target/config sai CONFIG_GUARD	Dừng trước connect/write; không dùng fallback.env
W01-TC02	Migration/seed thật REAL_DB	Có history/fixture version; không synchronize, không leak secret
W01-TC03	Seed/reset chạy lại REAL_DB	Số user/kho/quyền ổn định, không trùng và không tác động DB khác
W01-TC04	Login/profile REAL_API_DB_REDIS	200 đúng actor; không giả token hoặc bypass guards
W01-TC05	Ẩn danh REAL_API	401; không trả dữ liệu
W01-TC06	Thiếu authority REAL_API_DB	403, không dùng SUPER_ADMIN bypass; không trả dữ liệu
W01-TC07	Scope kho REAL_API_DB	Danh sách chỉ khoA; khoB bị che/chặn theo endpoint policy; không lộ dataB
W01-TC08	Rollback và helper race REAL_DB_HELPER	Barrier hoạt động, rollback không để ghi dở; không công bố nghiệp vụ confirm W04 đã PASS
W01-TC09	Browser login/list desktop REAL_BROWSER_API	API thật trả đúng dữ liệu/scope; không route.fulfill; không lỗi console chặn
W01-TC10	Browser mobile REAL_BROWSER_API	Thao tác chính dùng được; không overflow che action; evidence cùng run
W01-TC11	Browser auth/deny/logout REAL_BROWSER_API	Không hiển thị data trái phép; logout xóa session client; API vẫn quyết định quyền
W01-TC12	Full gate và test discovery FULL_GATE	Không suite compile/test fail chưa xử lý, không skip/coverage downgrade/no-tests-found

Run manifest bắt buộc

Run ID, timestamp, người chạy, Node24, exact command/exit, SHA và diff hash, target/fixture version, expected/actual, log/file hash, defects, retest và reviewer. Không password/token/private config. Lưu FAIL và NOT_RUN đúng thực tế; không bỏ test hoặc hạ coverage.

> **Gate mở W02 implement:** W01-QA.T COMPLETE, E02b VERIFIED bằng API/DB/Redis thật; full gate/browser có evidence, review code độc lập và owner acceptance đúng diff. Hồ sơ được duyệt không tự mở gate sản phẩm.

7. Rủi ro, thay đổi và cách vận hành

Rủi ro / owner	Xử lý / điều kiện mở
Snapshot04/11 cũ · BE/FE/QA	Tái lập trên SHA+dirtydiff thực; không gọi log cũ là kết quả live.
App start có cron/outbox/external transport · BE	Composition test vô hiệu side effects ngoài target test, cấu hình fail-closed; không vô hiệu guards để giả integration.
Migration legacy không chạy sạch · BE + điều phối	Ghi failure/DDL/history trên target mới; không sửa migration đã chạy hoặc dùng synchronize. Defect ngoài phạm vi có owner/plan.
Tranh chấp test resources · FE/QA	Tái lập worker/isolation/cleanup; giữ timeout/coverage; ghi cấu hình và chạy full check.
WIP upload / ID migration trùng · điều phối	Giữ ownership/migration047; đọc lại maxmigration khi nhận việc; không revert edits người khác.
Scope/effort vượt range · điều phối	CR/revision nếu đổi thiết kế; reforecast từ actuals, không âm thầm đổi baseline/hash.

Checkpoint thủ công đầu/cuối ngày làm việc, không tạo lịch chạy nền. Người thực hiện cập nhật progress-state/task tracker và GitHub checklist cùng evidence; không có cơ chế đồng bộ tự động được tuyên bố trong tài liệu này.

Template run/defect/completion · Quy trình track · Protocol và lệnh thực thi

8. Nguồn, truy vết và ISO tailoring

Nguồn	Artifact / SHA256
SRC-01 · Baseline quyết định R2	Mở artifact local a2f836650b3ced1b4b29a3bb8c03b55d29ca6b7ec74e2e616a59b8c758f9e070
SRC-02 · Kế hoạch R2 đội1:1:1	Mở artifact local 4e2297e24a97da80ef0df80739e9f1eef2d63113332940467d512717a95bddb5
SRC-03 · Gate và bằng chứng	Mở artifact local a3cdc81a6e40177766dcec4941bf38d85fb8849f7e6e94f1231ae3d15f9e719c
SRC-04 · Dossier W00	Mở artifact local 87d10bea82cf212635efa152b11f609f4234b970287f7b7e1e6603b0789fe275
SRC-05 · Dossier W01	Mở artifact local 63669bfa727f31b8f2226656553f9a712b4db46ad9318ad7533ec6b3dd529234
SRC-06 · Fixture 8actor/3kho	Mở artifact local d78e5a2c5c021431b1128478a77470c24884d54117d95368ffb911d2a4825470
SRC-07 · Grant test local	Mở artifact local 20fd89e74b7c8e7b76240a2b8346cee60b8ff8dc70667613d5de7e6a69f9e1e6
SRC-08 · Carryover upload	Mở artifact local bcd5421891a9124d9e03abd77372204ac9efec3b3a1c84d2d0db0315140e8314
SRC-09 · Audit API compile cũ	Mở artifact local 0e330d011e92d3cc6354a8cd941ed5114a9c088e5dd6478634356914b01e8767
SRC-10 · Audit UI full check cũ	Mở artifact local dddce18843cea07d8f45e16ec8c83c0932e312ec0d2ea09d5c82a7ca58860ade

Source hash bảo vệ tính toàn vẹn phiên bản; không thay đánh giá nội dung hoặc product test. Tài liệu local chưa nằm trên GitHub; issue chứa checklist/acceptance có thể đọc trực tiếp.

ISO tailoring và lịch sử phát hành

Tiêu chuẩn tham chiếu	Tailoring áp dụng trong hồ sơ
ISO/IEC/IEEE 15289:2019	Tổ chức mục đích, nội dung và kiểm soát hồ sơ vòng đời; mã tài liệu, phiên bản, nguồn, trách nhiệm và đầu ra.
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Nguồn yêu cầu, truy vết sang task/case, acceptance criteria và kiểm soát thay đổi yêu cầu.
ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021	Test plan, test design, case/procedure, execution record, incident và test completion report.
ISO 21502:2020	Lập WBS, trách nhiệm, phụ thuộc, nguồn lực, mốc, rủi ro và báo cáo tiến độ.

Cấu trúc tài liệu đã có mã/phiên bản, thẩm quyền phê duyệt, nguồn, WBS/ownership, entry/exit, evidence, traceability, rủi ro và change log. Đây là tailoring của dự án theo phạm vi công khai của tiêu chuẩn; chưa phải chứng nhận hoặc đánh giá tuân thủ đầy đủ từng điều khoản. Không tự tạo số clause.

9. Lịch sử thay đổi và phát hành

Revision / ngày	Nội dung / người phê duyệt
R1 /05/11/2026	Plan riêng W00/W01,9task49microtask,11issue; giữ R2 design, bổ sung phụ thuộc browser thật và bảng tiến độ. Codex — Điều phối theo ủy quyền người dùng ngày 05/11/2026

Issue publication map · Source register · Markdown plan
